

Salve detaljer

Pel (m)
45452.859

Hulltekst:
(ingen)

Borrplan:

Dosering (deg):
1.89

Borretning:
Minkende

Antall synlige hull:
122

Lengde synlige hull:
609.183

Areal beregn. grense (m):
10.00

Areal ansett (m2):
65.60

Areal salvebunn (m2):
81.67


Areal kontur (m2):
63.12

**Volum
beregnet
fra
borlogg**

	Gj.snitt m2	Overprofil %
Tunnellengde med logg	56,85	
Areal ansett	67,49	6,9 %
Areal salvebunn	83,95	33,0 %
Areal kontur	63,12	
Gjennomsnitt areal	73,53	16,5 %
Gjennomsnitt salvelengde	4,74	
Antall salver	12,00	
Første salve	45423,5	
Siste salve	45481,9	
Lengde siste salve	4,74	
Pel område	63,14	
Andel med logger	90,04 %	
Beregnet total volum	4180,49	
Beregnet overmasse	657,40	
Teoretisk Volum	3985,32	
Estimert total volum	4642,72	
Estimert overmasse	730,09	

**Volum
beregnet fra
borlogg**

Volum beregnet fra profiler

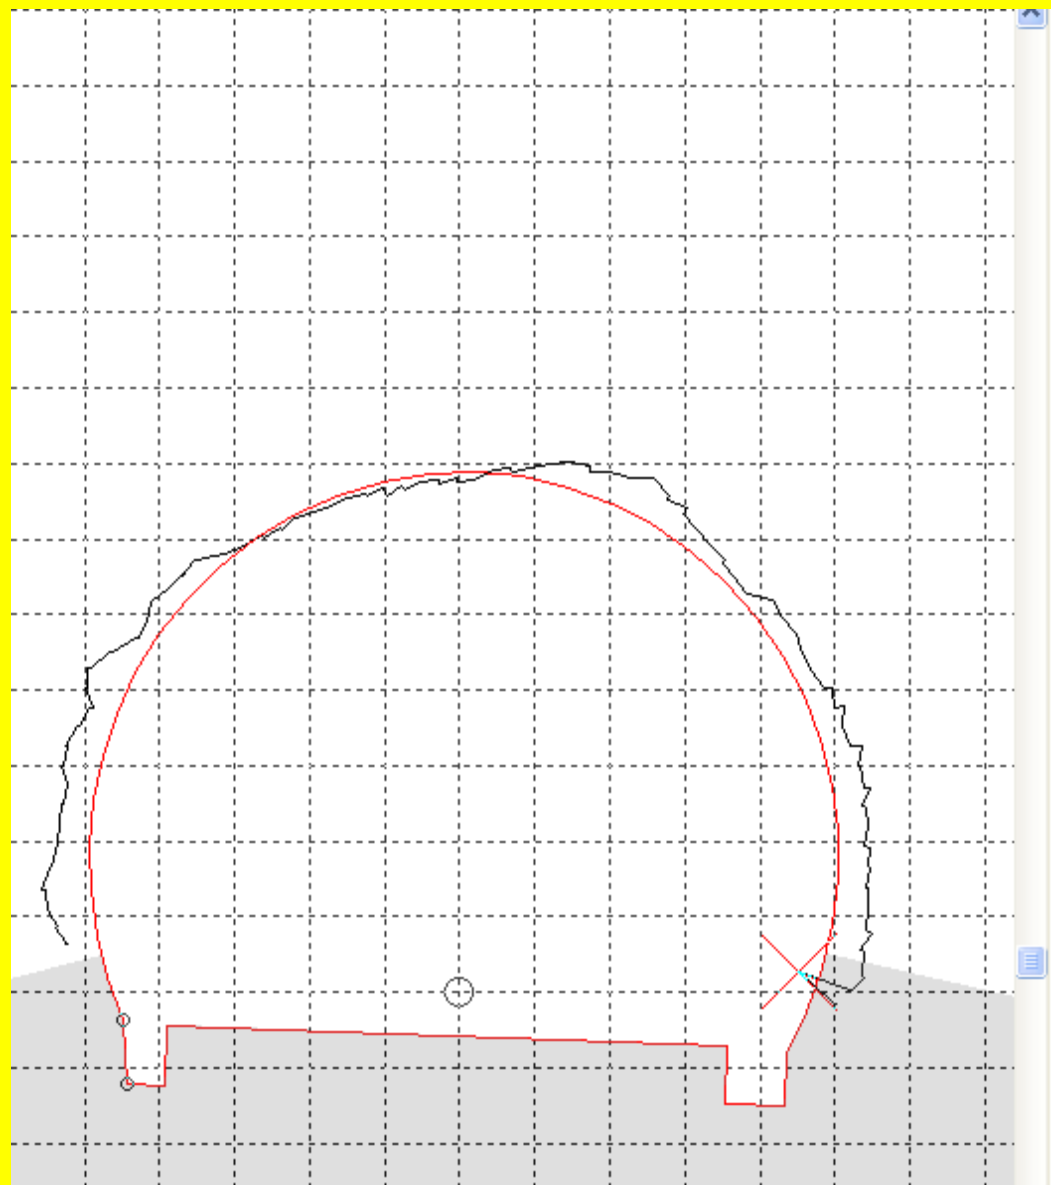

Utenfor kontur

Areal:	5.46	m ²
Lengde	14.75	m
Gj.snitt:	0.37	m
Geo: 0.00	5.46	m ²

Estimert

Areal:	5.5	m ²
Lengde	15.0	m
Målt:	98.6	%

Innenfor kontur

Areal:	0.28	m ²
Lengde	3.41	m
Gj.snitt:	0.08	m

Markør

Pe:	4322.43	m
Side:	4.50	m
Høyde:	0.27	m
Avvik:	-0.30	m

Såle:

Start høyre:	-4.77	m
Start høyde:	0.49	m
Slutt høyre:	4.88	m
Slutt høyde:	0.51	m

Volum beregnet fra profiler

Low Peg No	High Peg No
4330	4379,5

Teoretical contour	Total	per meter
ContourVolume (m3)	3176,895	63,54

Overbreak estimated measured (2)	364,35	7,29
Meas-Tunnelmeter (2)	49,5	0,99
Total Estimated Overbreak (2)	368,03	7,36
Total Volume tunnel(m3) (2)	3544,93	70,90
Overbreak percentage (2)		0,12
